

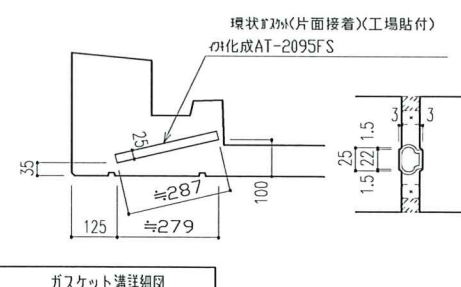
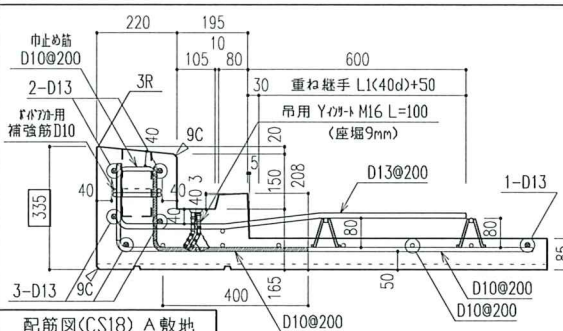
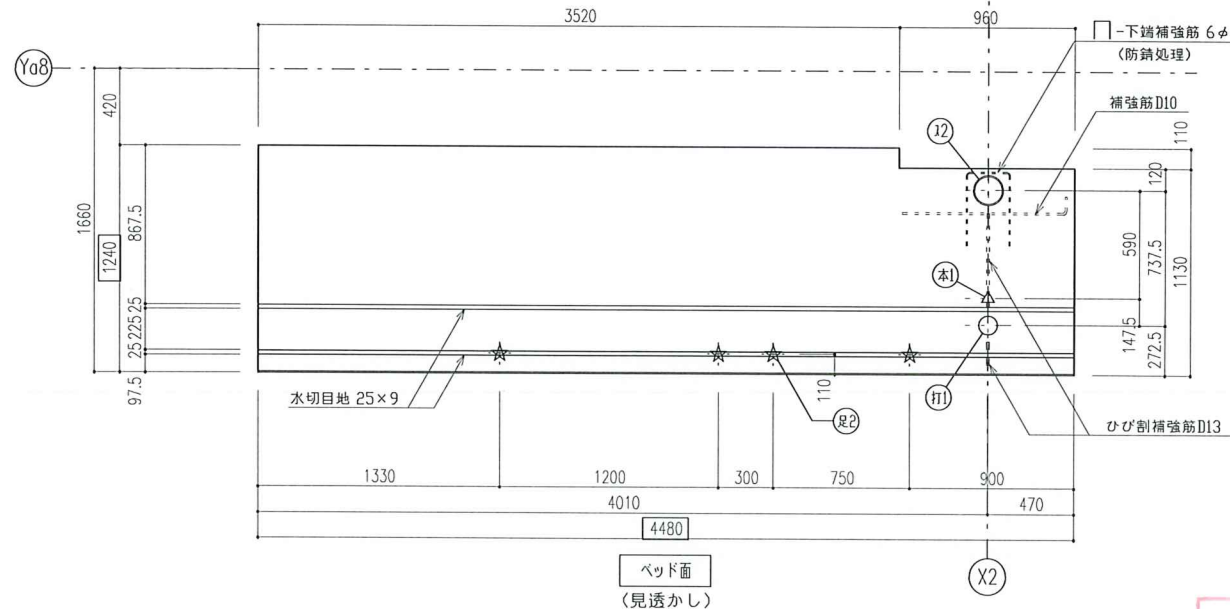
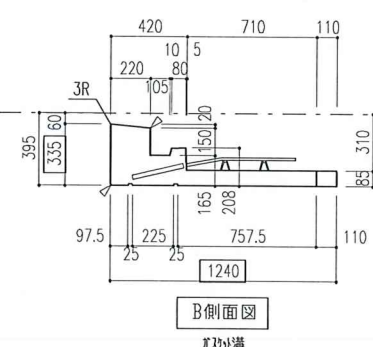


'24.04.26
'24.04.05
'23.09.06

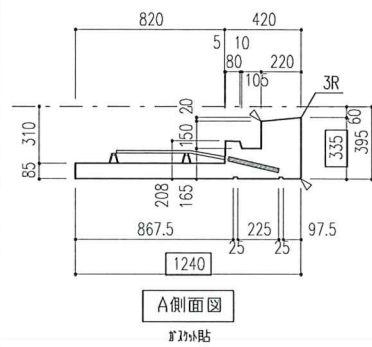

管理文書

5ABS54

6ABS54

7ABS54

8ABS54

9ABS54

10ABS54

11ABS54

12ABS54

13ABS54

14ABS54

15ABS54

16ABS54

17ABS54

18ABS54

19ABS54

20ABS54

21ABS54

22ABS54

23ABS54

合計

19

(備考)

打設前中間検査

検査項目

方法

検査

再検査

先付部品取付状況

目視

部材重量

1.90 t/p (CON:0.79m3)

鉄筋仕様

D10・D13

SD295

コンクリート強度

FC30

埋込部品一覧表

注) 吊1、脱1、ガスケット以外は支給品

記号

図形

名 称

数量

①

⊕

M16 Y-INS L=100(座堀9)

4

②

⊙

M16 □-INS L=100(座堀19)

③

☆

W1/2 P-INS L=40(座堀なし)

4

④

⊕

『バカ』(AL)
88×88(L=200)

5

⑤

△

W3/8 P-INS L=30(座堀なし)
(SUS)

1

⑥

⊙

M10 P-INS L=30(座堀なし)
(電気垂鉛メッキ)

⑦

⊕

ドコワツ RCK-3075

1

⑧

○

メテ WJ150(165) L=240

1

⑨

縫製ハッチ(タスカール)
SPC III 600-109<支給品>

特記事項

フルPCaの製品寸法、断面形状について、
辺長、部材厚のマイナスは許容しない

製品記号

製造年月日

年

月

日

フイソ-ビッケン

工 程

打設前中間検査

コンクリート打設前

型 枠

打設後

判定

1.合格 2.不合格

検査員

製品検査年月日

年

月

日

工 程

製品検査

仕 上 げ 後

製 品

判定

1.合格 2.不合格

検査員

出荷前検査年月日

年

月

日

工 程

出荷前検査

出 荷 前 検 査

最終確認

判定

1.合格 2.不合格

検査員

総合判定

1.合格 2.不合格

品質管理G
責任者

補修欄

キープラン(A敷地)

5~23S

<

トヨタT&S建設株式会社

株式会社 佐藤総合計画

作 禁 所

SCALE	1
-------	---

四町車地区第一種市街地再開発事業

施設建築物本体工事（A軟地 住宅棟）

面符号

EDGE 1

5ABS54

13-1

E-Q02-08模式 1 (00版)

240809【囲町A】5-13S(5-25あり)バルコニー承認図
