

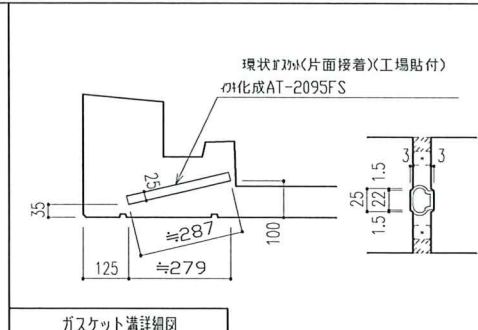
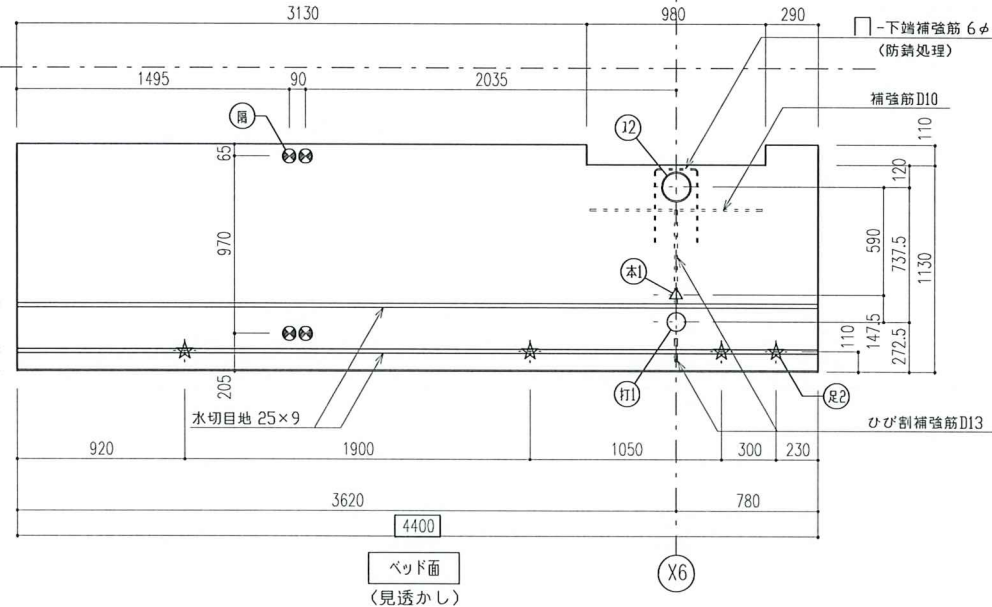


'24.05.24
'24.04.05
'23.09.06

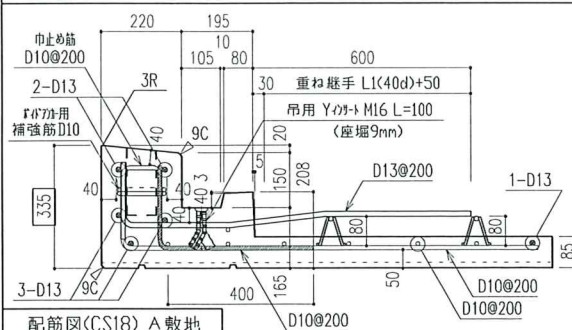

24.8.09

管理文書



株式会社 佐藤総合計画

作 樂 所

板 名

製品品質検査表

製品記号

製造年月日

フイン-ビックケン

工 程

打設前中間検査

コンクリート打設前

型 枠

打設後

判定

製品検査年月日

工 程

仕 上 げ 後

製品検査

判定

出荷前検査年月日

工 程

最終確認

判定

総合判定

補修欄

(備考)

打設前中間検査

検査項目

先付部品取付状況

部材重量

鉄筋仕様

コンクリート強度

埋込部品一覧表

注) 吊1、脱1、ガスケット以外は支給品

記号

図形

名 称

数量

特記事項

フルPCaの製品寸法、断面形状について、
辺長、部材厚のマイナスは許容しない

キープラン(A敷地)

10~13S

主方向 (短辺方向)

配筋方向 (長辺方向)

D13φ200

D10φ200

D10φ200

D10φ200

SCALE
A1: 1/20
A3: 1/40

DATE
2023.09.06

町町東地区第一種市街地再開発事業
施設建築物本体工事 (A敷地 住宅棟)

バルコニーPCa製品図

図面番号
5ABS22B

品質管理G
責任者

備考

240809【**囲町A**】5-13S(5-25あり)バルコニー承認図

E-QC02-08様式 1 【00版】
