










管理文書

※二次落下防止用インサートは、
吊1インサートと兼用する。

仕上面：全テ仕上げ
ハーフ部：ハケ引き仕上げ

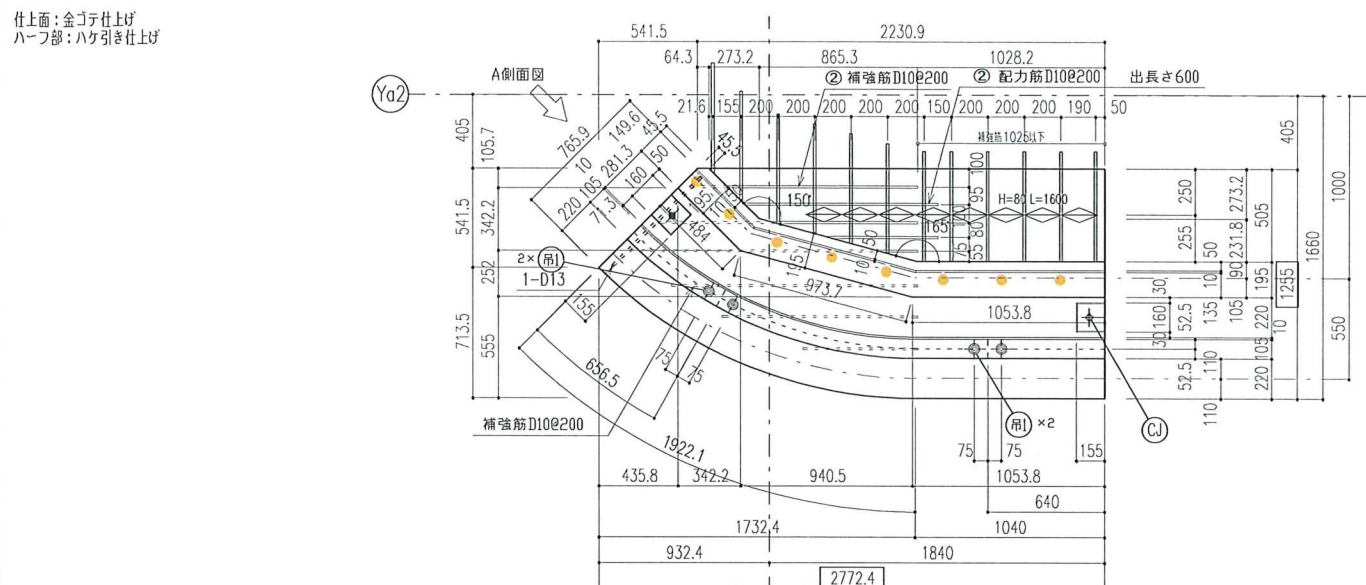

24.8.09
受
付
名
工
場

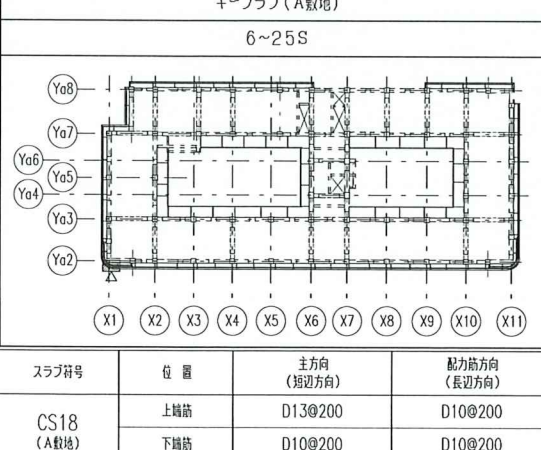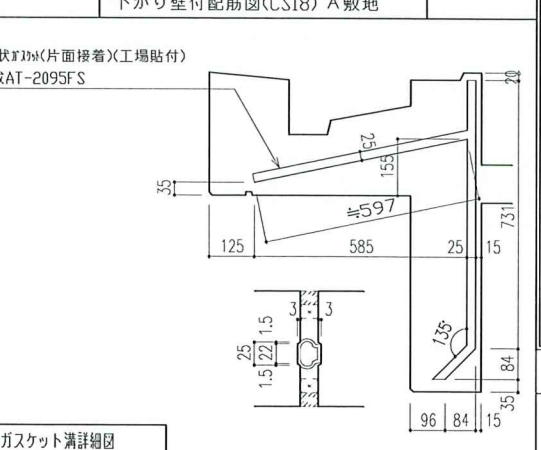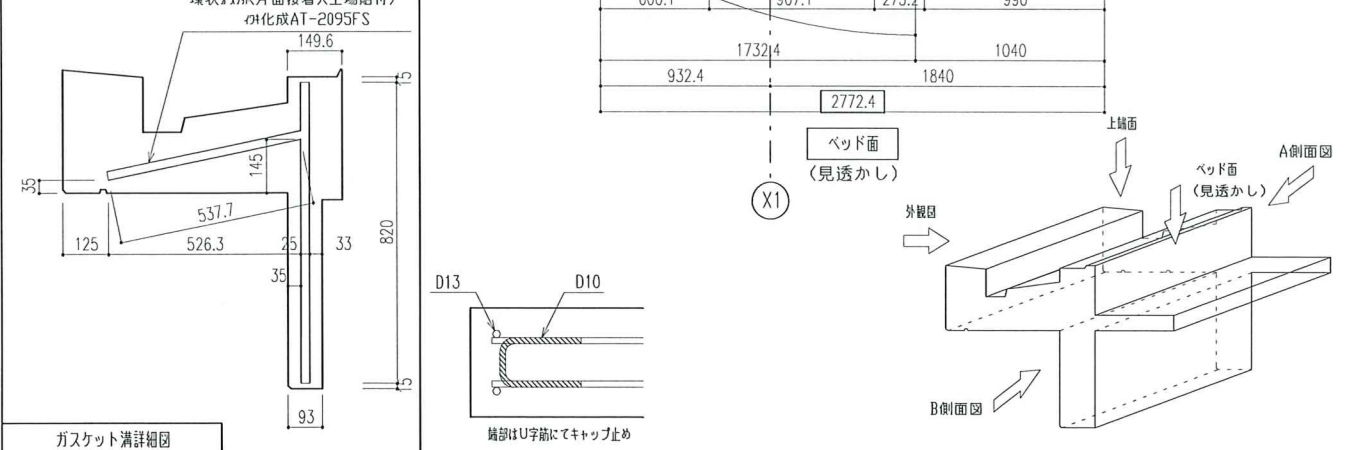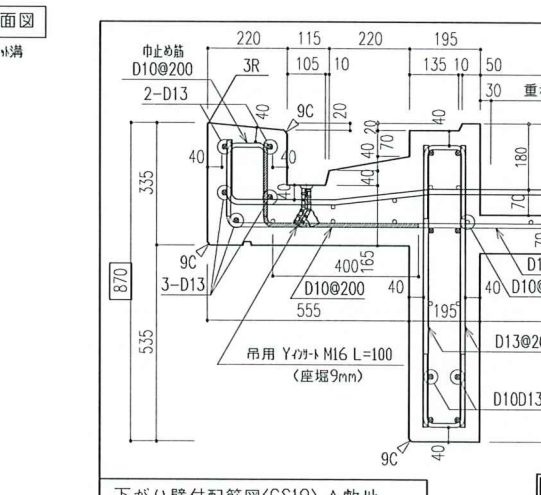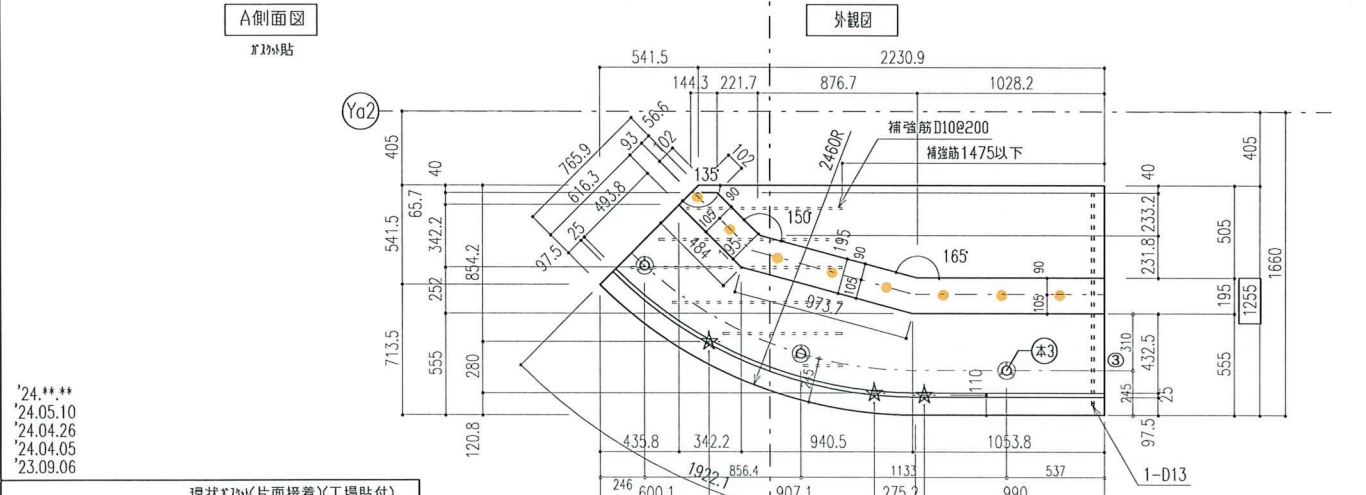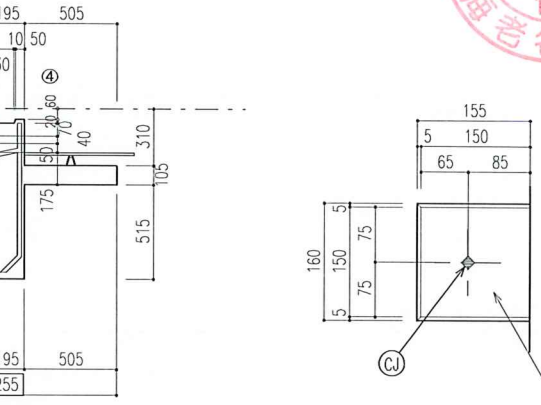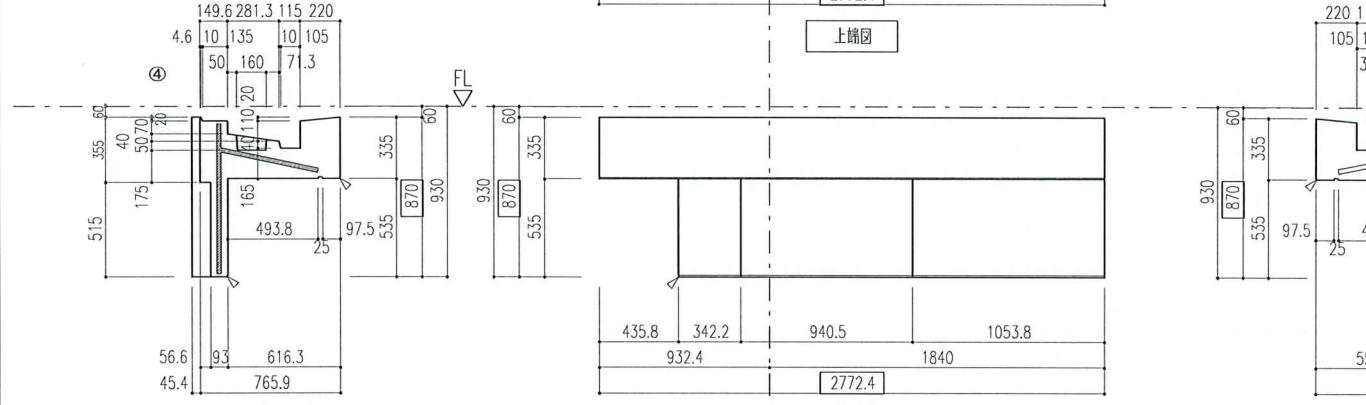

ガスケット詳細図	①24.04.26 サカバネ付修正 ②24.06.05 鉄筋表記修正 ③24.07.16 ガラス交換用インサート追加 ④24.07.22 立上り寸法変更
----------	---

ガスケット詳細図	株式会社 佐藤総合計画
----------	-------------

スラブ符号	位置	主方向 (短辺方向)	配筋方向 (長辺方向)
CS18 (A敷地)	上端筋 下端筋	D13@200 D10@200	D10@200 D10@200

製品品質検査表			
製品記号	製品記号		
製造年月日	年 月 日		
ラインナンバー	-		
工程	打設前中間検査		
コンクリート 打設前 中間検査	検査項目	方法	検査
	型枠清掃・組立状況	目視	
	型枠漏洩状況	目視	
	接合用金物種類・数量	目視	
	先付部品種類・数量	目視	
	異物混入有無	目視	
	鉄筋材質・径	目視	
	鉄筋本数	目視	
	鉄筋間隔・位置	目視	
	結束状態	目視	
型枠	補強筋状況	目視	
	かぶり厚	目視	
	辺長 (±3)	目視	
	板厚 (±2)	目視	
	ねじれ・そり (±3)	目視	
	面の凹凸 (±3)	目視	
	曲がり (±3)	目視	
	対角線長差 (±3)	目視	
	接合用金物 (±2)	目視	
	先付部品 (±5)	目視	
打設後	打設面仕上げ状況	目視	
判定	1.合格 2.不合格		
製品検査年月日	年 月 日		
工程	製品検査		
仕上 後 製品検査	検査項目	方法	検査
	製品記号マーキング	目視	
	表面の仕上げ	目視	
	ひび割れ	目視	
	欠け	目視	
	豆板	目視	
	気泡	目視	
	表面の傷・汚れ	目視	
	辺長 (±5)	目視	
	板厚 (±3)	目視	
製品	ねじれ・そり (±5)	目視	
	面の凹凸 (±5)	目視	
	曲がり (±5)	目視	
	対角線長差 (±5)	目視	
	接合用金物 (±5)	目視	
	先付部品 (±10)	目視	
判定	1.合格 2.不合格		
出荷前検査年月日	年 月 日		
工程	出荷前検査		
最終 確認 出荷前検査	検査項目	方法	検査
	表示	目視	
	ひび割れ・欠け・変形	目視	
	金物・部品等状態	目視	
	検査員		
	判定	1.合格 2.不合格	
	総合判定	1.合格 2.不合格	
	品質管理G 責任者		
	補修欄		
	作業所		
スケール	A1: 1/20 A3: 1/40	工事 内容	団町東地区第一種市街地再開発事業 施設建築物本体工事 (A敷地 住宅棟)
DATE	2023.09.06	図番	5ABS12A
バルコニーPCa製品図			
